

000 林建字第 000 號

00 區 00 段 000 地號住商大樓新建工程人行道修復工程

施工計劃書

起造人：

監造人：

承造人：

目錄

一、工程名稱	3
二、工程單位	3
三、工程內容	3
四、工程範圍	3
五、工程時程	4
六、施工方法	4-7
七、施工期間自主品管	8
八、路面完成修復作業規定	8
九、完工後路面驗收	8
十、附件	
1. 修復道路保證書	9
2. 施工前路面現況照片	10-11
3. 柔性告示牌與施工宣傳單	12-13
4. 建照執照影本	14-16

一、工程名稱：00 區 00 段 000 地號住商大樓新建工程（000 林建字第 000 號）

二、工程單位：

1. 起造人：

聯絡人：

電話：

2. 監造人：

聯絡人：

電話：

3. 承造人：

聯絡人：

電話：


4. 施工廠商：

聯絡人：

電話：

三、工程內容：人行道面飾材全面打除重新整鋪工程

A. 型式：濕式紙模地坪；B. 款式：灰色、網織型

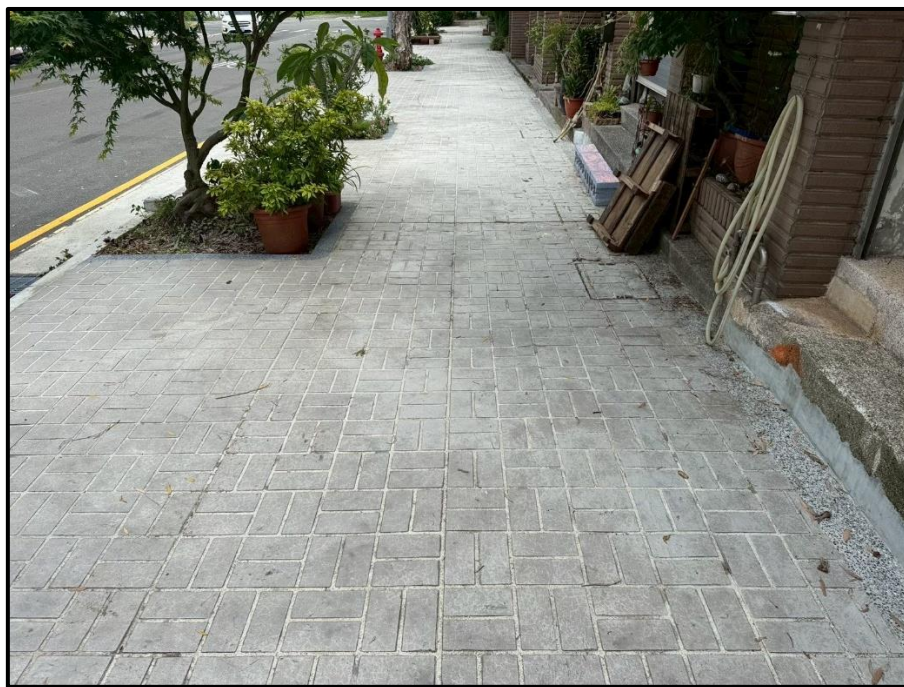

圖一，濕式紙模地坪(灰色、網織型)示意圖。

四、工程範圍：00市00區000路0段000巷建築基地前方路段，如圖二所示。



圖二，施工範圍示意圖。

五、施工時程：

預計將利用(114年8月25日至114年09月25日上午9時至下午4時)


進行人行道地坪及側溝頂版修復工程。

預計日期	時間	施工順序
114/08/25~114/09/25	1天	交維設施就位
	5天	人行道打除作業
	2天	地面整平
	2天	點焊鋼絲網鋪設
	2天	高程設置
	2天	混凝土澆置、鋪設紙模、撒佈耐磨料
	2天	紙模拆除
	7天	養護
	1天	設施復舊

六、施工方法：


施工前置作業→舊有人行道打除→碎料清掃→地面整平→鋪設點焊鋼絲網→設置標高器→混凝土澆置→鋪設紙模→撒佈耐磨料→紙模拆除→養護→設施復舊，以上皆採人行道封閉及借用道路路肩約1.5米寬替代行人臨時通道。

人行道路緣石尺寸圖及鍍鋅格柵蓋詳圖：

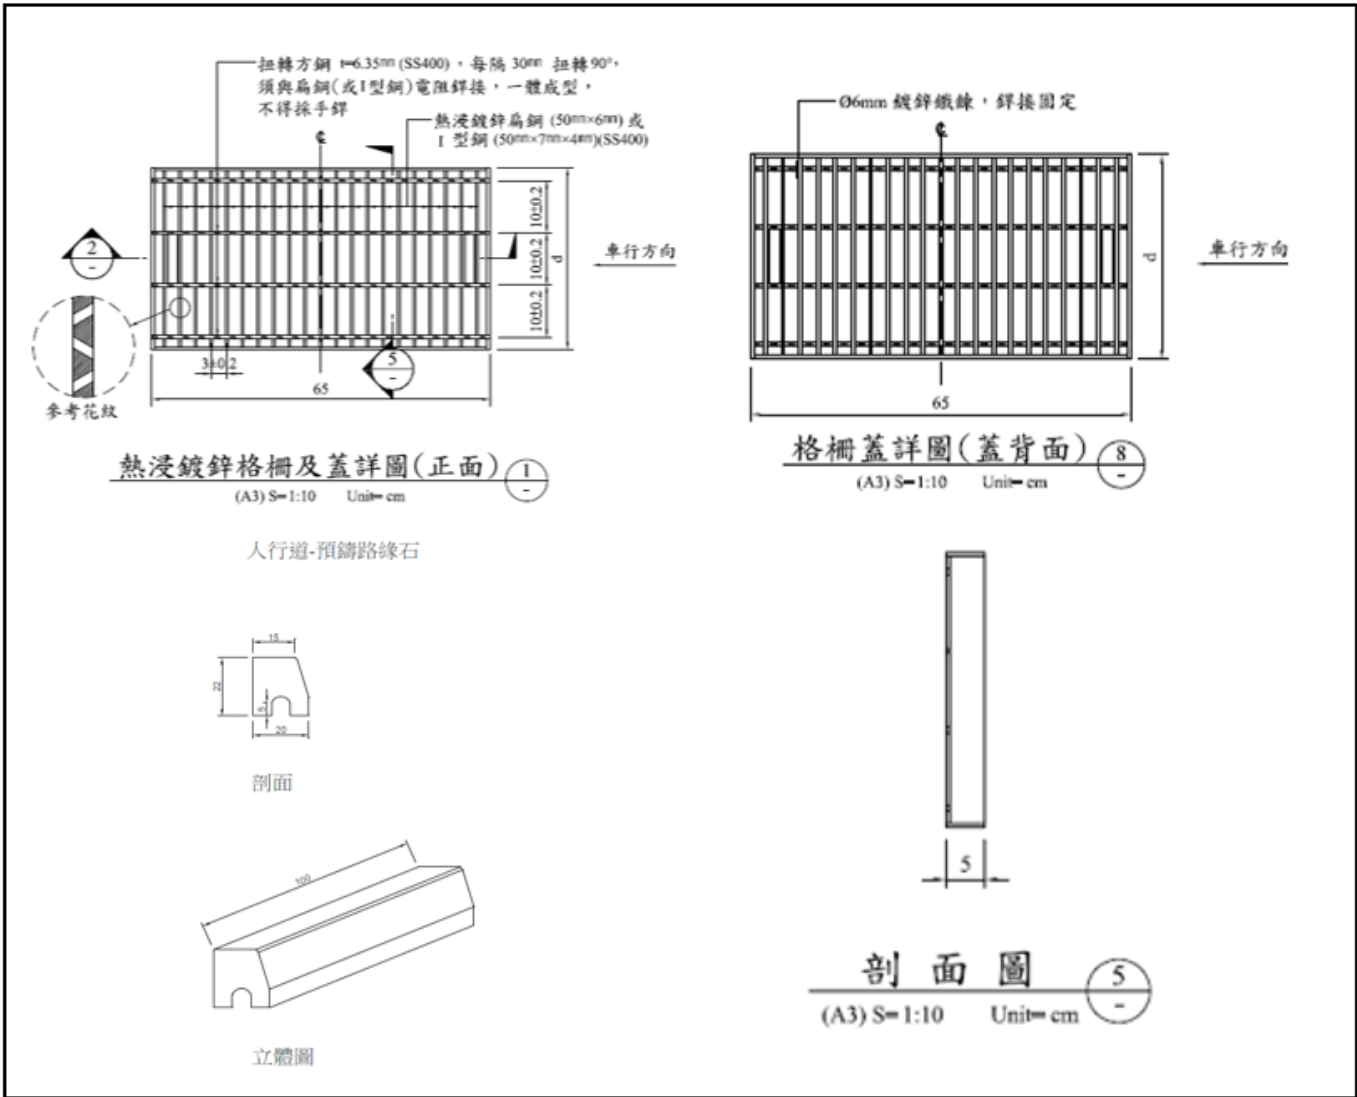


圖三，人行道路緣石及鍍鋅格柵蓋圖說

人行道鍍鋅化妝蓋尺寸圖：

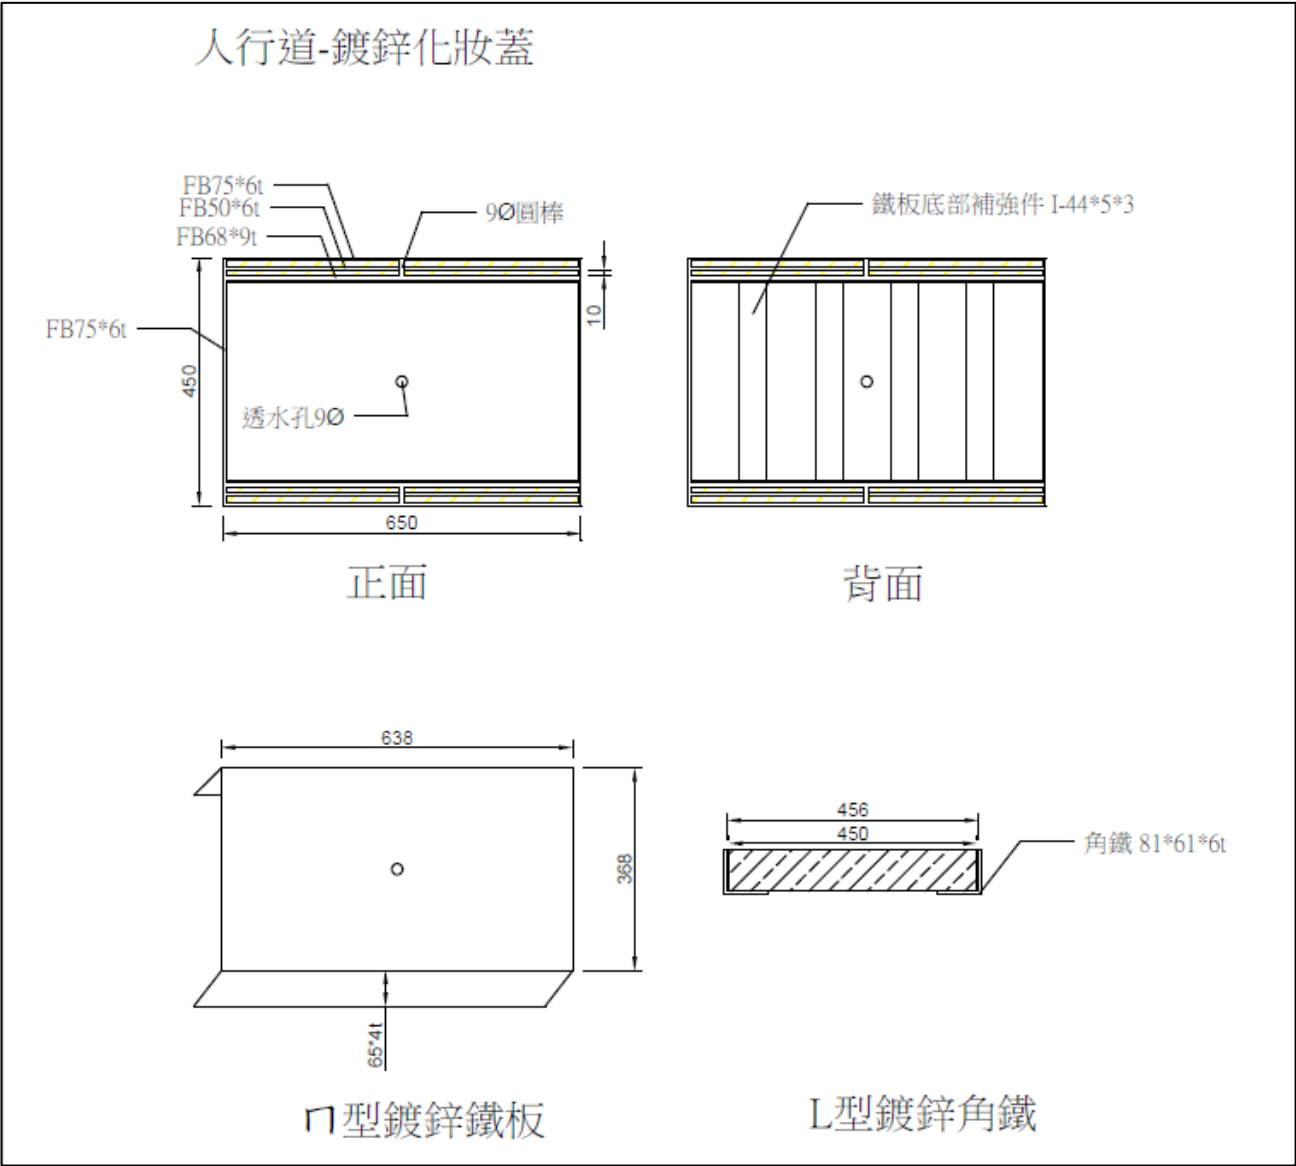


圖四，人行道鍍鋅化妝蓋圖說

00路0段00巷施工封閉範圍及交維佈設圖，如下圖五、圖六所示。

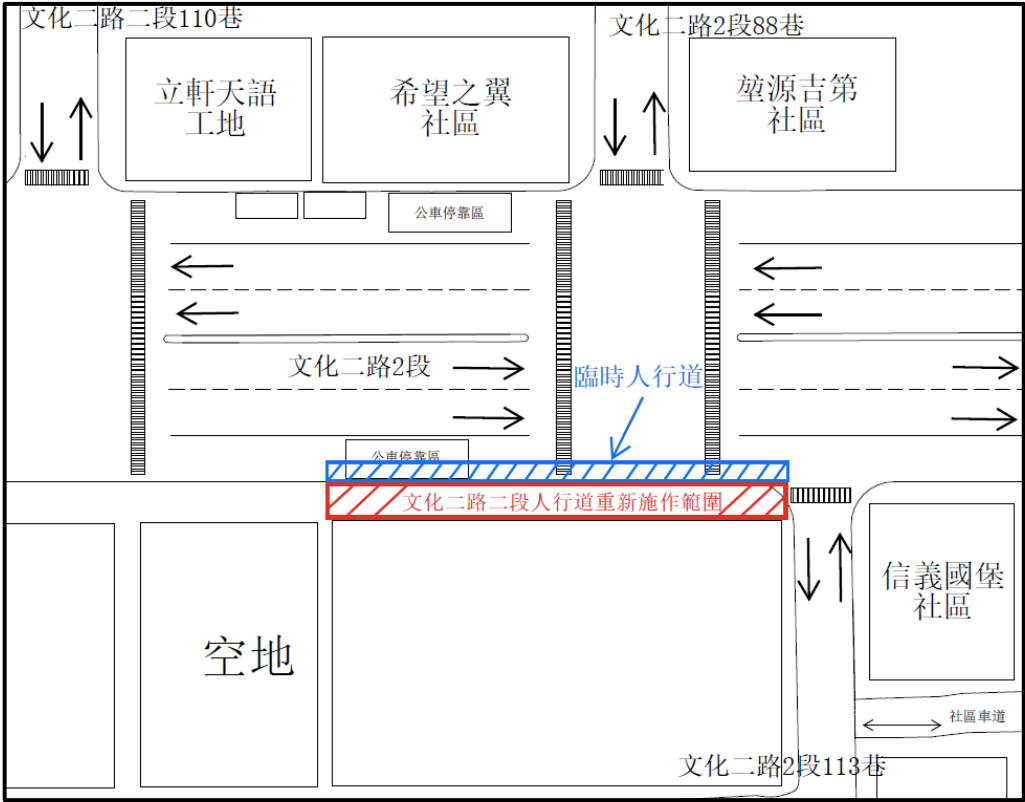

圖五，00路0段00巷施工範圍示意。

00路0段000巷，交通維持設施佈設圖，如下圖所示。

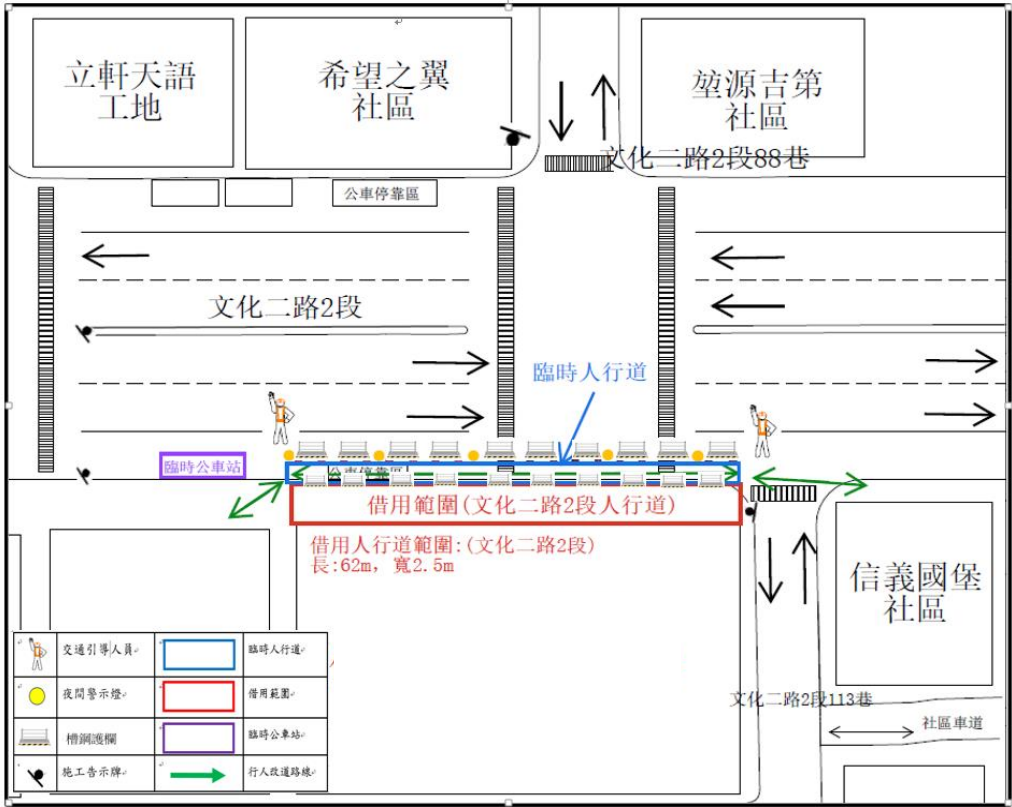

圖六、000路0段000巷交通維持設施布設圖

七、施工期間自主品管：

1. 每日工量：

人行道打除重新施做施工含路面養護及設施復舊，採局部施工彈性調整。

2. 現場(主管及聯絡人)姓名、聯絡電話：

現場聯絡人：

電話：


八、路面完成修復作業規定：

1. 長度範圍：00 區 00 段 000 地號住商大樓新建工程基地建築界標道路，施工範圍

圍如圖五所示。

2. 寬度範圍：採人行道寬度(約2.5米)全面打除重鋪修復。

3. 人行道型式：採用濕式紙模地坪，款式:灰色、網織型。

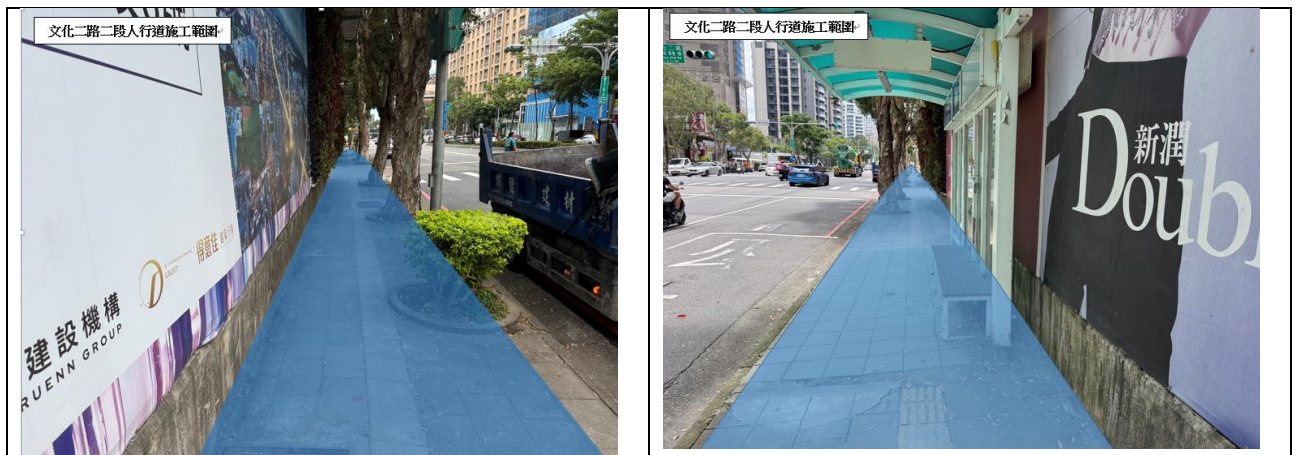

圖七，00路0段000巷旁施工範圍示意。

九、完工後路面驗收：

1. 本工程完工後並於接管驗收後保固一年。

保 證 書

本公司因新北市政府工務局 000 林建字第 000 號建築工程完工人行道修復工程需向貴所申請人行道及溝頂版重新施作，地點：新北市林口區 000 路 0 段 000 巷旁 000 區 00 段 000 地號住商大樓新建工程，有關道路鋪面修復依新北市政府建築工程人行道修復規定辦理，如有修復不良、損壞、下陷等情形，本公司願無條件修復原狀，並於 貴所驗收接管日起保固一年。

此致

新北市政府林口區公所工務課

起造人：

地 址：

電 話：

--	--

中 華 民 國 1 1 4 年 0 8 月 0 1 日

道路現況照片



000路0段000巷旁現況照片。

人行道現況照片



000路0段000巷旁人行道現況照片。

宣導單： 新北市00區00段00地號住商大樓新建工程


施工公告

本工程將於:114年8月25日9時~16時至114年9月25日9時~16時

進行人行道打除重鋪作業

屆時將影響車輛及行人通行，造成您的不便，

也請配合改道通行，敬請見諒

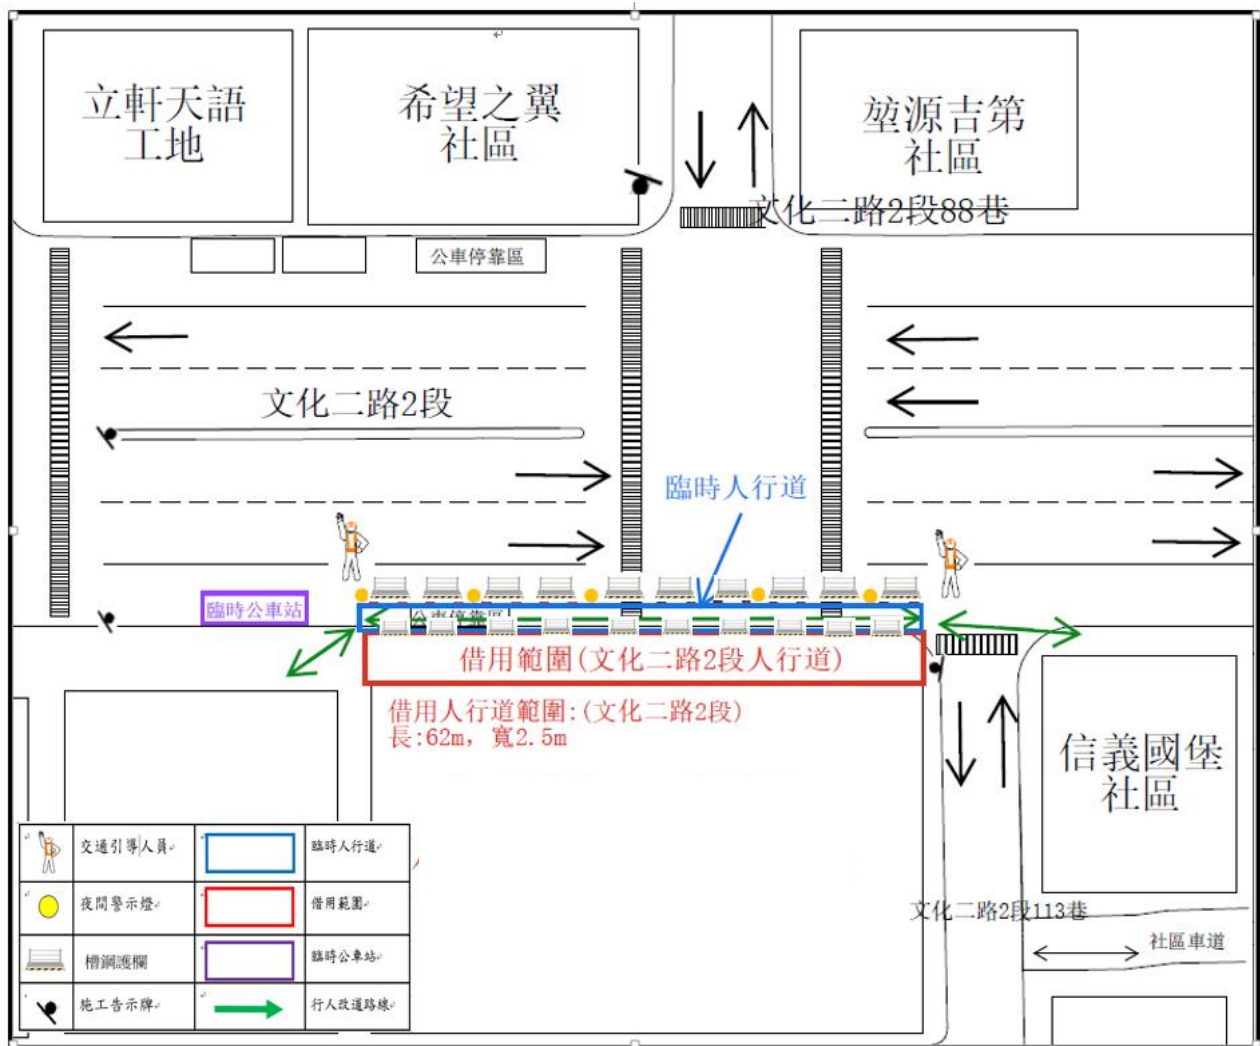


00建設(股)有限公司 工務所 敬啟

聯絡人： 電話：

中 華 民 國 1 1 4 年 0 8 月 0 1 日

告示牌：

(正面)

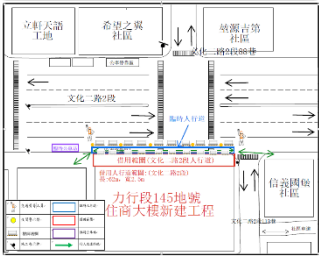

08/25-09/25(假日除外)

09:00-16:00

前方道路施工，車輛請減速慢行

行人請改道通行。

(反面)

段

地號住商大樓新建工程

人行道打除重鋪作業

新北市政府工務局 建造執照

起造人	姓名	
	住址	
設計人	姓名	
基地概要	地 號	
	地 址	
	使用分區	
	基地面積	
建築物概要	主要用途	
	建造類別	
	構造種類	
	建築面積	
	總樓地板	
	法定空地	
	法定停車	
	190	
	雜項工程	
	工程造價	
規定開工期限		
核 准 日 期		
供公眾使用建築		
上列工程准予		
上給		

收執

局長 詹榮鋒



中 華 民 國 110 年 10 月 13 日

校對 3/1/12

林建字第 號

監造人		事務所名稱		建築師事務所	
承造人		廠商名稱		營造廠 工程股份有限公司	
核准開工展期		年 月 日		核准竣工展期 年 月 日	
第 次變更	核准日期文號	111 年 02 月 22 日新北工建字第 1110318018 號			
	變更概要				
第 次變更	核准				
	變更概要				
第 次變更	核准				
	變更概要				
第 次變更	核准				
	變更概要				
第 次變更	核准				
	變更概要				
